



LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SUMBER DANA APBD + APBN + PHLN

Status Bulan : JULI 2018

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KATA PENGANTAR

Laporan pelaksanaan anggaran ini disusun setiap bulan yang bertujuan merangkum hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melakukan perbaikan untuk bulan berikutnya sehingga deviasi pencapaian target tahunan dapat diminimalisir.

Laporan pelaksanaan anggaran bulan Juli 2018 ini mencakup antara lain target dan progress pelaksanaan APBD pada Dinas PUPR, indikator capaian kinerja Dinas PUPR sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016-2021 dan rincian pelaksanaan per kegiatan (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) yang terdiri dari indikator output kegiatan, realisasi fisik dan keuangan.

Demikian laporan pelaksanaan anggaran Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat bulan Juli 2018 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Agustus 2018


PPTK

DAFTAR ISI

I.	TARGET DAN PROGRESS PELAKSANAAN APBD DINAS PUPR	4
II.	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	9
III.	REALISASI BELANJA LANGSUNG	15
IV.	REKAPITULASI PELAKSANAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	16
V.	RINCIAN PELAKSANAAN PER KEGIATAN (BELANJA LANGSUNG)	17
LAMPIRAN I.	TABEL REALISASI KEGIATAN DINAS PUPR BULAN JULI 2018	
LAMPIRAN II.	SK JALAN PROVINSI TAHUN 2015	

TARGET DAN PROGRES PELAKSANAAN APBD

1. Komposisi APBD 2018

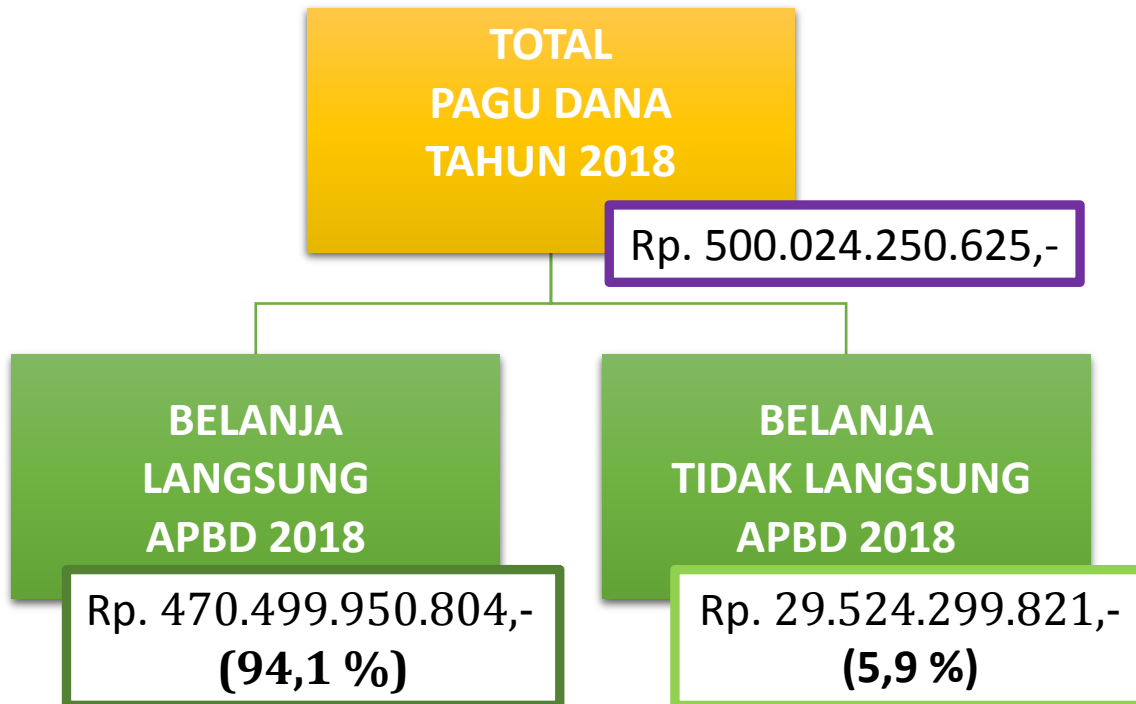

1. DPA TA. 2018


Belanja Tidak Langsung	: Rp. 29.524.299.821,-
Belanja Langsung	: Rp. 470.499.950.804,-
TOTAL APBD 2017	: Rp. 500.024.250.625,-

2. **URUSAN** : A. Pekerjaan Umum
B. Penataan Ruang

PROGRAM	: 16 Program
KEGIATAN	: 105 Kegiatan
PAKET	: 133 Paket

TARGET DAN PROGRES PELAKSANAAN APBD

2. Standar prosedur dan penilaian terhadap progress

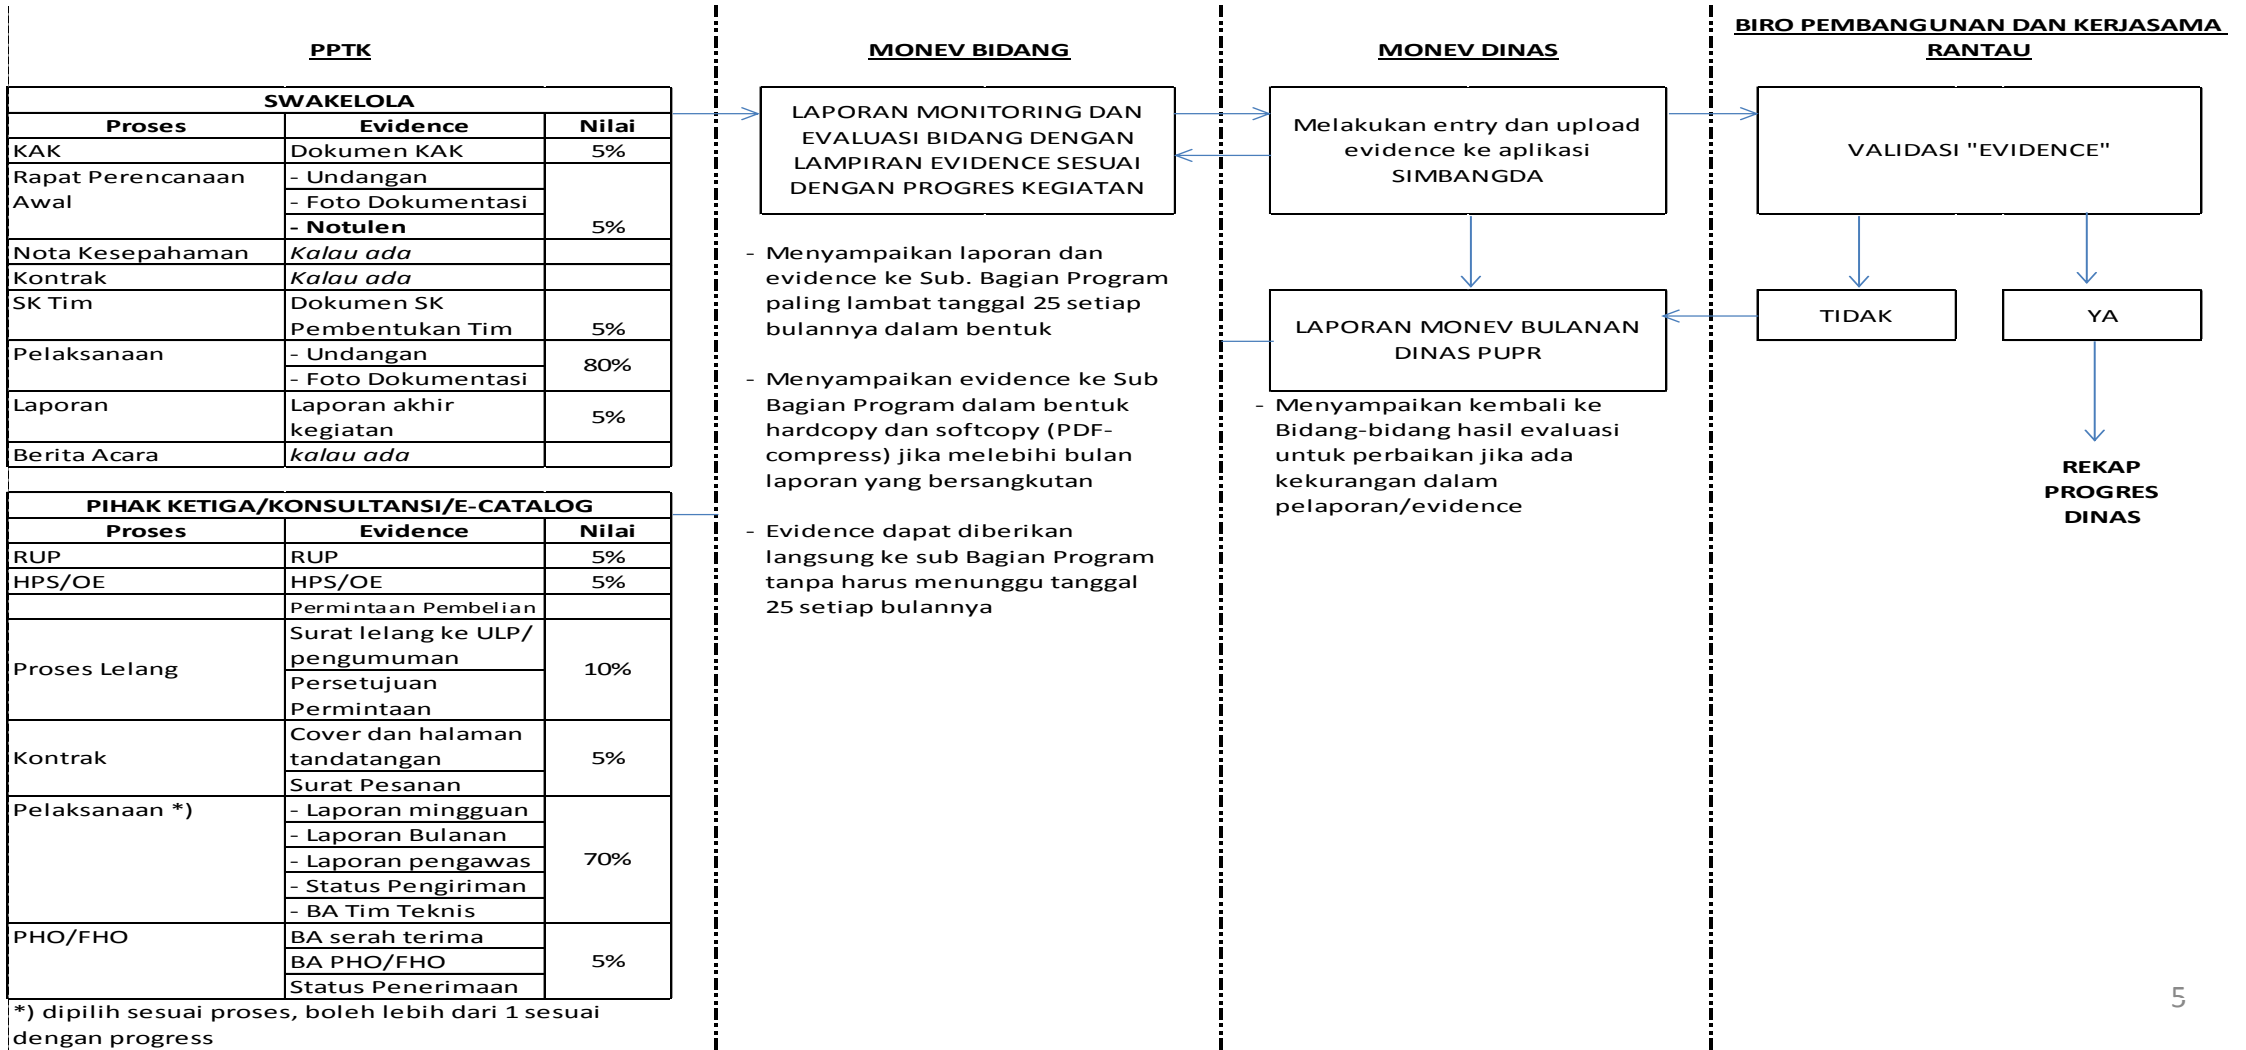

TARGET DAN PROGRES PELAKSANAAN APBD

2. Standar Prosedur dan Penilaian Penilaian Terhadap Progress

Bobot Pekerjaan dengan Pihak Ketiga :

1. RUP = 5 %
2. HPS / OE = 5 %
Ada Surat Pengantar ke Biro / ULP = 10%
3. Proses Lelang / Pejabat Pengadaan
Sudah Ada Pengumuman
4. Kontrak = 5 %
Dokumen Kontrak
5. Pelaksanaan = 70 %
Laporan Pengawasan (Bulanan / Akhir)
6. PHO = 5 %
Berita Acara PHO

Bobot Pekerjaan Swakelola :

1. KAK = 5 %
2. Rapat Awal = 5 %
Notulen Rapat
3. SK Tim = 5 %
4. Pelaksanaan = 80 %
Undangan
Foto
5. Laporan = 5 %
Laporan Akhir / Penyelesaian Pekerjaan

TARGET DAN PROGRES PELAKSANAAN APBD

3. Target & Kemajuan Fisik dan Keuangan

1. Target pelaksanaan fisik kegiatan diperoleh dari data rencana pelaksanaan per masing-masing kegiatan dan kontrak paket-paket pekerjaan dan direkapitulasi menjadi target fisik Dinas PUPR, yaitu :

Target = 54,96 %

Realisasi (Juli 2018) = **38,09 %**

Deviasi = **-16,87 %**

2. Target keuangan disesuaikan dengan aliran kas yang disusun pada Rencana Kegiatan dan Anggaran, yaitu :

Target = 74,218 %

Realisasi = **16,99%**

Deviasi = **-52,53 %**

3. Terdapat perbedaan data dengan realisasi fisik yang ada pada Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda) karena adanya beberapa dokumen pelaksanaan kegiatan yang belum divalidasi.
4. Rendahnya realisasi keuangan salah satunya diakibatkan oleh adanya kegiatan pihak ketiga yang tidak mengambil termynin, dan kegiatan pengadaan barang yang sudah 100% tetapi belum melakukan pencairan dana.
5. Data lebih lengkap terlampir pada tabel berikut

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	BOBOT	BULAN												
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
	BELANJA LANGSUNG	470.499.950.804,00	100,00													
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.391.571.940,00	1,15	-	-	25,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	5.553.165.360,00	1,18	-	-	9,41	1,84	5,73	3,92	10,68	8,87	25,99	25,99	5,73	1,84	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	329.692.000,00	0,07	-	-	5,00	-	5,00	-	10,00	5,00	35,00	35,00	5,00	-	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	224.376.000,00	0,05	-	-	25,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.420.560.000,00	0,30	-	-	25,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	219.353.214.238,00	46,62	-	-	9,22	13,08	10,95	9,95	11,87	14,01	13,84	14,20	2,61	0,26	
VII	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	57.905.197.000,00	12,31	-	4,04	6,74	10,00	12,13	11,30	11,64	11,99	12,13	11,44	4,89	3,70	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	2.010.866.190,00	0,43	-	-	25,00	2,53	54,75	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
IX	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	656.941.000,00	0,14	-	-	5,00	10,00	10,00	12,50	12,50	12,50	12,50	10,00	10,00	5,00	
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.033.794.100,00	34,01	-	0,11	5,52	5,70	14,75	14,75	14,77	14,72	14,65	9,98	4,96	0,08	
XI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	1.462.199.465,00	0,31	-	-	7,50	7,50	8,33	8,33	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	10,00
XII	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	5.027.882.510,00	1,07	-	-	10,00	14,62	13,83	10,02	10,35	9,64	12,47	10,59	8,47	-	
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	479.717.250,00	0,10	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
XIV	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	274.458.030,00	0,06	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
XV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	2.953.100.721,00	0,63	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
XVI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA	7.423.215.000,00	1,58	-	-	5,62	5,62	10,00	5,62	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	5,62
	FISIK (RENCANA)		100,00	0,00	0,53	7,91	9,79	12,47	11,55	12,71	13,71	13,88	12,34	4,14	0,97	
	AKUMULASI FISIK (RENCANA)			0,00	0,53	8,44	18,23	30,70	42,24	54,96	68,67	82,54	94,89	99,03	100,00	
	REALISASI FISIK			0,00	0,00	1,31	15,60	25,24	30,20	38,09						
	DEVIASI			0,00	0,00	-7,13	-2,63	-5,46	-12,04	-16,87						
	KEUANGAN (RENCANA)		268,85	2,87	6,76	10,37	12,50	15,18	14,57	11,96	12,35	6,20	2,54	2,42	2,28	
	AKUMULASI KEUANGAN (RENCANA)			2,87	9,63	20,00	32,50	47,68	62,25	74,21	86,56	92,76	95,30	97,72	100,00	
	REALISASI KEUANGAN			0,00	0,00	1,23	7,25	11,01	16,99	21,68						
	DEVIASI			2,87	0,00	-18,77	-25,25	-36,67	-45,26	-52,53						

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

Persandingan Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR sesuai target RPJMD

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2015	TARGET 2021	CAPAIAN TAHUN 2016-2021								
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	TAPKIN			
7.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	Persentase kemantapan jalan provinsi	%	91,13*/69**	75	70	90,5	71	70	72	72	73	74	75
		Panjang jaringan jalan provinsi yang ditingkatkan	km	1195	1525	55	31	55	62,4	55	37,7	55	55	55
		Panjang jembatan provinsi yang terbangun	m	350	1750	400	573,8	400	275	400	418	400	400	400
		Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan tersusun	dokumen	15	122	32	12	50	50	67	-	86	103	122
		Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan dan infrastruktur strategis	ha	4	20	7	-	10	-	13	11.320 m2	16	19	20

Penurunan realisasi pada indikator Persentase kemantapan jalan provinsi terjadi karena adanya perubahan SK Jalan Provinsi tahun 2015 (terlampir)

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

Persandingan Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR sesuai target RPJMD

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2015	TARGET 2021	CAPAIAN TAHUN 2016-2021									
						2016		2017		2018		2019	2020	2021	
						TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL				
8.	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi	Persentase kemantapan jalan provinsi	%	91,13*/69**	75	70	90,5	71	70	72	72	73	74	75	
		Panjang jalan provinsi yang direhabilitasi	km	1143,1	1214,93	1143,66	1151,31	1214,93	1258,52	1214,93	1246,84	1214,93	1214,93	1214,93	
		Panjang jembatan provinsi yang direhabilitasi	m	145	745	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Panjang jalan Tds yang dipelihara	km	10	50	17	10	24	-	31	5	38	45	50	

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

Persandingan Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR sesuai target RPJMD

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2015	TARGET 2021	CAPAIAN TAHUN 2016-2021								
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
						TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL			
9.	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase peningkatan kualitas alat ukur labor	paket	4	22	30	4	31	4	32	4	33	34	35
10	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan kualitas SDM Pelaku jasa konstruksi	orang	1850	9650	70,27	16 kali	140,54	12 kali	210,81	9 kali	281,08	351,35	421,62
14	pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi	Persentase jaringan drainase yang dibangun	km	25	60	41	0	53	0	65	5	77	88	100
15	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	meningkatnya rumah tangga bersanitasi	%	72	77	72	-	73	-	74	-	75	76	77

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

Persandingan Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR sesuai target RPJMD

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2015	TARGET 2021	CAPAIAN TAHUN 2016-2021								
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
						TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL			
11	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	%	68	74	69	72,32	70	75,83	71	76	72	73	74
		SPAM Regional terbangun	kawasan	1	8	0	0	2	0	5	0	0	0	0
		SPAM IKK ditingkatkan	kawasan	30	102	19	7	11	1	9	1	9	9	15
		Peningkatan kinerja pelayanan SPAM	%	68	74	69	72,35	70	75,83	71	76	72	73	74

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

Persandingan Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR sesuai target RPJMD

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2015	TARGET 2021	CAPAIAN TAHUN 2016-2021								
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
						TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL			
12	Penyelenggaraan Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Persentase jumlah bangunan pemerintah yang direkonstruksi pasca bencana	unit	12	34	15%	1	30%	6	50%	1	65%	85%	100%
		Persentase jumlah bangunan strategis terbangun	unit	0	4	15%	0	30%	1	50%	4	65%	85%	100%
		Persentase jumlah rumah negara terbangun	unit	9	12	15%	2	30%	2	50%	3	65%	85%	100%
		persentase tempat evakuasi sementara terbangun	unit	4	10	15%	0	30%	0	50%	0	65%	85%	100%

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

Persandingan Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR sesuai target RPJMD

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2015	TARGET 2021	CAPAIAN TAHUN 2016-2021								
						2016		2017		2018		2019	2020	2021
						TARGET	REAL	TARGET	REAL	TARGET	REAL			
16	Perencanaan penataan ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	%	79	86	1,2	84	1,35	84	1,41	84	1,48	1,56	0
		tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	dokumen	0	30	5	9	10	4	15	1	20	25	30
		pembangunan kawasan	unit	0	6	1	2	2	0	3	0	4	5	6
17	Pengendalian dan Pemanfaatan ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	%	79	86	1,2	84	1,35	84	1,41	84	1,48	1,56	0
		terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis SPM Bidang penataan ruang	laporan	0	19	19	19 kab/kota	19	1 dok	19	1 dok	19	19	19

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

Untuk belanja tidak langsung, realisasi sampai dengan bulan Juli 2019 telah mencapai 62,41 %. Peningkatan realisasi terjadi di bulan Juni-Juli setelah pembayaran gaji 13 dan 14.

Untuk lebih jelasnya , rincian belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	DANA Rp.	REALISASI			SISA	KET
				FISIK	KEUANGAN Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	1.03 1.03.01 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	29.524.299.821	62,41	18.427.372.696	62,41	11.096.927.125	
	5 1 1	Belanja Pegawai	29.524.299.821	62,41	18.427.372.696	62,41	11.096.927.125	

REKAPITULASI PELAKSANAAN BELANJA LANGSUNG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	FISIK	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG	470.499.950.804,00	38,09	102.002.839.568	21,68	368.497.111.236
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.391.571.940,00	39,30	1.896.707.335	35,18	3.494.864.605
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.553.165.360,00	38,39	1.649.062.303	29,70	3.904.103.057
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	329.692.000,00	5,00	-	0,00	329.692.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	224.376.000,00	21,97	49.302.900,00	21,97	175.073.100
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.420.560.000,00	45,14	579.664.894,00	40,81	840.895.106
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	219.353.214.238,00	42,66	47.131.600.813,00	21,49	172.221.613.425
VII	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	57.905.197.000,00	50,93	21.925.116.209,00	37,86	35.980.080.791
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	2.010.866.190,00	68,24	784.878.200,00	39,03	1.225.987.990
IX	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	656.941.000,00	28,78	189.077.155,00	28,78	467.863.845
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.033.794.100,00	28,89	34.736.750.432,00	21,71	125.297.043.668
XI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	1.462.199.465,00	32,91	460.243.500,00	31,48	1.001.955.965
XII	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	5.027.882.510,00	36,05	696.025.169,00	13,84	4.331.857.341
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	479.717.250,00	47,09	146.795.500,00	30,60	332.921.750
XIV	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	274.458.030,00	40,57	111.361.011,00	40,57	163.097.019
XV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	2.953.100.721,00	6,20	12.045.128,00	0,41	2.941.055.593
XVI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA	7.423.215.000,00	7,66	193.434.861,00	2,61	7.229.780.139

RINCIAN PELAKSANAAN PER KEGIATAN (BELANJA LANGSUNG)

- Terdapat 133 paket yang ada di Dinas PUPR, dan terdapat 2 perubahan paket pada pergeseran anggaran yaitu pembangunan Sport Hall menjadi Rehab gedung KONI serta pengawasannya.
- Dari 133 paket yang ada, 113 paket yang telah tanda tangan, 13 paket telah mencapai 100% dan sisanya yang belum 20 paket terdiri dari 5 tender, 5 PL dan 5 pengadaan
- Paket yang belum kontrak yaitu :
 - 2 paket SPAM, akan dilakukan perubahan
 - 2 paket drainase, akan dilakukan perubahan
 - 2 paket Kelok 9, sedang proses tanda tangan
 - 1 paket Doklingk gedung utama kantor gubernur, sedang proses tanda tangan
 - 2 paket Convention hall, sedang proses lelang ulang
 - 1 paket Pengadaan Pakaian dinas, proses lelang ulang
 - 2 paket pagar kantor Dinas PU dan 1 paket pemeliharaan gedung kantor (plafond), sedang proses Penunjukan Langsung
 - 1 paket event organizer di TR, sedang proses lelang
 - 2 paket pengadaan di sekretariat dan 4 paket pengadaan di Bina Marga
- Lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian kegiatan terlampir

SK JALAN PROVINSI NO TAHUN 2015 (bg.I)

KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON/ TANAH	BELUM TEMBUS
007		Simancung - Tj. Ampalu	11,08	11,08		
008		Tj. Ampalu - Sijunjung	20,00	20,00		
010		Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29,00	29,00		
011		Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu	11,90	11,90		
012		Simp. Koto Baru - Junction	5,40	5,40		
018		Indera Pura - Muara Sakai	7,30	7,30		
025		Manggopoh - Padang Luar	69,43	69,43		
028		Sicincin - Kurai Taji	16,44	16,44		
031		Panti - Simpang Empat	74,23	74,23		
033		Simpang Empat - Sasak	20,00	20,00		
034	2	Air Balam - Air Bangis	12,60	12,60		
035		Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18,50	18,50		

SK JALAN PROVINSI NO TAHUN 2015 (bg.II)

KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON/ TANAH	BELUM TEMBUS
036		Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28,79	28,79		
037		Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10,40	10,40		
038		Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30,60	30,60		
039		Guguk Cino - Sitangkai	15,12	15,12		
040		Sitangkai - Tj. Ampalu	17,28	17,28		
044		Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	50,61	50,61		
054		Junction - Abai siat	12,60	12,60		
055		Sijunjung - Tanah Badantung	4,40	4,40		
056	1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20,00	20,00		
056	2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17,00	17,00		
056	3	Abai Sangir - Sei. Dareh	74,00	14,53	59,48	
068		Padang Sawah - Kumpulan	36,50	36,50		
069	2	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	46,85	46,85		
070		Batusangkar - Ombilin	18,51	18,51		

SK JALAN PROVINSI NO TAHUN 2015 (bg.III)

KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON/ TANAH	BELUM TEMBUS
071		Solok - Alahan Panjang	47,80	47,80		
072		Lubuk Basung - Sungai Limau	30,90	30,90		
073		Pasar Baru - Alahan Panjang	49,40	23,84	25,56	
075		Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	20,50	20,50		
076		Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73,95	58,95	15,00	
078		Simpang Koto Mambang - Balingka	39,40	39,40		
079		Simpang Baso - Piladang	11,14	11,14		
080		Matur - Palembang	20,70	20,70		
081		Palembayan - Palupuh (Simp. Patai)	13,30	13,30		
082		Alahan Panjang - Kiliran Jao	72,90	17,05	25,83	30,03
083		Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44,10	1,31	30,19	12,60
084		Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh)	14,17	14,17		
085		Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional)	2,05	2,05		
086		Surantih - Kayu Aro - Langgai	27,70	4,50	13,20	10,00

SK JALAN PROVINSI NO TAHUN 2015 (bg.IV)

KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON/ TANAH	BELUM TEMBUS
087		Duku - Sicincin	28,65	0,00	18,65	10,00
088		Padang Koto Gadang - Palembang	31,00	31,00		
089		Jl. Balingka - Terowongan - Ngarai Sianok	9,70	9,70		
090		Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi	25,00	13,00	12,00	
091		Simpang Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	23,00	5,00	18,00	
092		Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	28,40	28,40		
093		Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting	30,00	27,00	3,00	
094		Pintu Angin - Labuah Saiyo	5,50	3,00	2,50	
095		Rao - Rokan (Batas Riau)	33,00	33,00		
096		Lubuk Sikaping - Talu	28,00	7,00	21,00	
097		Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43,20	2,50	40,70	
098		Teluk Bayur - Nipah - Purus	12,00	3,00	8,80	0,20
099		Purus - Bandara International Minangkabau	16,00			16,00
100		Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1,20	1,20		

SK JALAN PROVINSI NO TAHUN 2015 (bg.V)

KODE RUAS		NAMA RUAS JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN		
NO. RUAS	SFX			ASPAL	BETON/ TANAH	BELUM TEMBUS
101		Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	47,00	3,00	38,00	6,00
102		Rawang - Talawi	6,00	6,00		
103		Simp. SP II - Kantor Camat	5,10		5,10	
104		Kantor Camat - Berkat	5,90		5,90	
Total Panjang Jalan Provinsi			1525,20	1097,47	342,90	84,83
