



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang  
Email : perkimpertanahan.sumbar@gmail.com**

Padang, 06 Januari 2020

Nomor : 001/LT/Perkimtan/Kws/I-2020  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Tahunan 2019

Kepada, Yth:  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sumatera Barat  
di

TEMPAT

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Kegiatan Bidang Kawasan Permukiman Tahun 2019.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian dan koreksi Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang  
Kawasan Permukiman

**SIRDANY, ST. MM**

NIP. 19620212 199203 1 008

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Kawasan Permukiman dimana mendukung tugas pemerintahan dan tugas binaan dengan ini kami melaporkan sebagai berikut:

### RENCANA PROGRAM DALAM Mendukung KEGIATAN APBD DAN APBN SERTA PROGRAM STRATEGIS LAINNYA

#### PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

##### 1. Kegiatan Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

INDIKATOR	TOLAK UKUR KEGIATAN	TARGET KINERJA
Masukan	Tersedianya Dana	Rp. 1.139.668.000,-
Keluaran	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan	2 Dokumen
Hasil	Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran	100%
Manfaat	1) Penurunan Luasan Kawasan Kumuh 2) Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi	Meningkat
Dampak	Masyarakat menerima Manfaat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Meningkat

##### 2. Kegiatan Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi

INDIKATOR	TOLAK UKUR KEGIATAN	TARGET KINERJA
Masukan	Tersedianya Dana	Rp. 8.298.511.630,-
Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan	3 Lokasi
Hasil	Terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	100%
Manfaat	1) Penurunan Luasan Kawasan Kumuh 2) Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi	Meningkat
Dampak	Masyarakat menerima Manfaat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Meningkat

##### 3. Kegiatan Updating Database Kawasan Kumuh

INDIKATOR	TOLAK UKUR KEGIATAN	TARGET KINERJA
Masukan	Tersedianya Dana	Rp. 873.756.000,-
Keluaran	Terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat	1 Dokumen
Hasil	Tersedianya Database Kawasan Kumuh Kab/Kota Se-Sumatera Barat	100%
Manfaat	1) Penurunan Luasan Kawasan Kumuh 2) Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi	Meningkat
Dampak	Masyarakat menerima Manfaat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Meningkat

4. Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)

INDIKATOR	TOLAK UKUR KEGIATAN	TARGET KINERJA
Masukan	Tersedianya Dana	Rp. 1.400.000.000,-
Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus	4 Paket
Hasil	Tersedianya PSU Kawasan Strategis dan Khusus	100%
Manfaat	Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Meningkat
Dampak	Masyarakat menerima Manfaat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Meningkat

II. KEGIATAN

Pada Tahun Anggaran 2019, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memberikan tugas kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman, sebagai pelaksana kegiatan dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Barat.

1. Kegiatan Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu, di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat dengan Nilai Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.139.668.000 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah,-)
2. Kegiatan Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu: di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Kawasan Wisata Danau Singkarak Kabupaten Solok dan di Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman dengan Nilai Pagu Anggaran Rp.8.298.511.630,- (Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah,-)
3. Kegiatan Updating Database Kawasan Permukiman dilaksanakan pada Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat dengan Nilai Pagu Anggaran Sebesar Rp. 845.596.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah,-)
4. Kegiatan Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal) untuk Paket Pekerjaan Tahun sebelumnya dan Lanjutan dengan Nilai Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah,-)

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Mendukung APBD

1. Kegiatan Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nilai Kontrak Rp.514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh PT. Synpra Engineering Consultant.
2. Kegiatan Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLPK-BK) di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat dengan Nilai Kontrak Rp.514.800.000,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh PT. Synpra Engineering Consultant.



3. Kegiatan Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan Nilai Kontak Sebesar :
  - Pembangunan PLP2K-BK di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Rp.2.289.731.102,68,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Koma Enam Puluh Delapan Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Karya Gemilang.
  - Addendum Pembangunan PLP2K-BK di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Rp.2.518.656.536,87,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Koma Delapan puluh Tujuh Rupiah)
  - Pengawasan Pembangunan PLP2K-BK di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Rp.99.481.250,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh CV. Total Citra Counsultan.
4. Kegiatan Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi di Kawasan Wisata Danau Singkarak Kabupaten Solok :
  - Pembangunan PLP2K-BK di Kawasan Wisata Danau Singkarak Kabupaten Solok Rp.2.114.643.603,01,- (Dua Milyar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Koma Nol Satu Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh CV. Karsiko
  - Addendum PLP2K-BK di Kawasan Wisata Danau Singkarak Kabupaten Solok Rp.1.390.655.813,48,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Koma Empat Puluh Delapan Rupiah,-). Ini dikarenakan adanya permintaan masyarakat untuk pembuatan U-dith tertutup secara menyeluruh tertuang dalam Berita Acara Rapat Walinagari Nomor: 100/78/NSKR/X-2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Kelanjutan Pembangunan PSU Kawasan Strategis Danau Singkarak sehingga tidak sesuai dengan perencanaan, maka terjadi Optimasi Pekerjaan
  - Pengawasan PLP2K-BK di Kawasan Wisata Danau Singkarak Kabupaten Solok Rp.99.132.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah,-) Yang dilaksanakan oleh CV. Artistik Engineering Consultant.
5. Kegiatan Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi di Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman:
  - Pembangunan PLP2K-BK di Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman Rp.2.218.008.441,21,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Koma Dua Puluh Satu Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh CV. Rasid Jaya Konstruksi. Terjadi pemutusan kontrak dikarenakan Direktur CV. Rasid Jaya Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak.
  - Pengawasan Pembangunan PLP2K-BK di Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman Rp.99.154.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah,-) yang dilakukan oleh Circle Engineering Consultant. Pekerjaan ini tidak bisa dibayarkan dikarenakan Progress Pekerjaannya tidak sesuai dengan Output/Keluaran tidak tercapai.
6. Kegiatan Updating Database Kawasan Permukiman dilaksanakan pada Kabupaten dan Kota Sumatera Barat dengan Nilai Pagu Anggaran Sebesar Rp.744.537.750,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh PT. Belaputera Interplant Counsultan.

7. Kegiatan Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal) di Kawasan Wisata Linggai Kabupaten Agam untuk Pekerjaan Tahun 2018 dengan Nilai Kontrak Sebesar :
- Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam Rp.1.067.986.500,- (Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh CV. Bana Baraka.
  - Pengawasan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam Rp.64.766.000,- (Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh CV. Pagar Sukma.
  - Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam Lanjutan Rp.199.124.655,50,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Koma Lima Puluh Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh CV. Permata Nagari.
  - Pengawasan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam Lanjutan Rp.9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah,-) yang dilaksanakan oleh CV. Total Citra Counsultan.

#### IV. HASIL DAN MANFAAT

1. Kegiatan Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman

a. Hasil	:	Tersedianya Perencanaan Infrastruktur Dikawasan Permukiman Kumuh
b. Manfaat	:	Terkendalinya Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

2. Kegiatan Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu: di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Kawasan Wisata Danau Singkarak Kabupaten Solok dan di Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman

a. Hasil	:	Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
b. Manfaat	:	Terkendalinya Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

3. Kegiatan Updating Database Kawasan Permukiman dilaksanakan pada Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat

a. Hasil	:	Tersedianya Data Kawasan Permukiman Kumuh yang Valid dari Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat
b. Manfaat	:	Terkendalinya Kawasan Kumuh Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat

4. Kegiatan Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal) untuk Paket Pekerjaan Tahun sebelumnya dan Lanjutan

a. Hasil	:	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus
b. Manfaat	:	Terkendalinya Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus



V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENYELESAIAN

No.	PERMASALAHAN-PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
1.	Masih ada lokasi perencanaan yang belum tuntas sehingga lokasi perencanaan masih ada yang belum direncanakan.	Wali nagari perlu merapatkan kembali dengan masyarakat yang terkena program pembangunan baik itu lokasi Salido maupun lokasi Sasak Ranah Pesisir.
2.	Adanya permintaan masyarakat yang tidak sesuai dengan perencanaan semula pada pekerjaan pembangunan drainase kawasan strategis danau Singkarak ,dimana masyarakat meminta saluran yang dibuat harus ditutup.sedangkan perencanaan adalah saluran terbuka .	Sudah dilakukan pembicaraan dengan masyarakat setempat, tetapi masyarakat tetap bersikukuh dengan permintaannya agar saluran yang dibuat harus memakai tutup.sehingga pekerjaan yang sudah tergalil tetap dilanjutkan dengan memakai penutup dan yang lain dilakukan optimasi pekerjaan karena mendapat penolakan dari masyarakat
3.	Pekerjaan pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak terjadi putus Kontrak.	Sudah dilakukan teguran I,II,III terhadap kontraktor CV.Rasid Jaya Konstruksi ,tetapi kontraktor tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai akhir kontrak .kami telah melakukan pemutusan kontrak dengan mencairkan jaminan pelaksanaan,jaminan uang muka dan memasukan kedalam daftar hitam.
4.	Masih ada lokasi kawasan kumuh yang belum di SK kan oleh Bupati dan Wali Kota	Bupati dan walikota menunggu data base kawasan kumuh yang dibuat oleh Provinsi dan kemudian diterbitkan SK revisinya .
5.	Kegiatan pembangunan kawasan wisata linggai dan supervisi belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2018.	Dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2019 dan sudah dibayarkan termasuk pekerjaan lanjutan untuk penyelesaian.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari beberapa kegiatan yang berada pada Bidang Kawasan Permukiman dengan ini kami simpulkan sebagai berikut :

- Perencanaan PLP2K-Bk dapat diaplikasikan dilapangan sehingga luasan Kawasan Kumuh di daerah menjadi berkurang
- Pembangunan Drainase dan MCK di Kawasan Kumuh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- Updating Database menjadi dasar awal untuk melakukan Perencanaan dan Pembangunan di Kawasan Kumuh di Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat
- Tersedianya Lapangan Parkir, MCK dan Taman di Kawasan Wisata Linggai akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisata ke Sumatera Barat

2. Saran

Dari beberapa kegiatan yang berada pada Bidang Kawasan Permukiman dengan ini dapat kami sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- Pembiayaan dalam Perencanaan PLP2K-BK agar ditingkatkan pada tahun berikutnya karena luasnya Kawasan Kumuh di Sumatera Barat
- Sebelum pembangunan Drainase dan MCK dimulai, perlu adanya sosialisasi supaya masyarakat dapat membebaskan lahan pekerjaan
- Kegiatan Updating Database agar dapat disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
- Operator yang telah mengikuti pelatihan di Provinsi dapat melakukan Penginputan Data Luasan Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- Lapangan Parkir, MCK dan Taman yang telah dibangun dapat dipelihara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Laporan Fisik dan Keuangan
2. Foto Pelaksanaan Kegiatan

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**SIRDANY, ST. MM**  
NIP. 19620212 / 99203 1 008

Laporan Realisasi Kegiatan  
Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2019

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)	Tanggal Addendum	Nilai Addendum (Rp.)	Tanggal Penyelesaian	Realisasi Kegiatan		SILPA (Rp.)	Keterangan
								Fisik	Keuangan (Rp.)		
1.	Perencanaan PLP2K-BK Kaw. Kpg Pondok Kab. Pasaman PT. Sympira Engineering Consultant	541.070.250	24/07/2019	514.800.000,00	30/07/2019	514.800.000,00	26/11/2019	100%	514.800.000	26.270.250	PHO
2.	Perencanaan PLP2K-BK Kaw. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan PT. Sympira Engineering Consultant	541.070.250	24/07/2019	514.800.000,00	30/07/2019	514.800.000,00	26/11/2019	100%	514.800.000	26.270.250	PHO
3.	Updating Database Kawasan Kumuh Prov. Sumbar PT. Belaputera Interplan Consultant	790.387.200	19/08/2019	744.537.750,00	-	-	16/12/2019	100%	744.537.750	45.849.450	PHO
4.	Pembangunan PLP2K-BK Kaw. Sontang Cubadak Kab. Pasaman CV. Rasid Jaya Konstruksi	2.600.000.000	27/08/2019	2.218.008.441,21	-	-	24/12/2019	43,447%	964.323.530	1.635.676.470	Putus Kontrak
5	Pengawasan PLP2K-BK Kaw. Sontang Cubadak Kab. Pasaman CV. Circle Engineering Consultant	100.000.000	27/08/2019	99.154.000,00	-	-	24/12/2019	43,447%	-	100.000.000	Putus Kontrak
6	Pembangunan PSU Kaw. Danau Singkarak Kab. Solok CV. Karsilko	2.600.000.000	29/07/2019	2.144.643.603,01	06/11/2019	1.390.655.813,48	02/12/2019	100%	1.390.655.813	1.209.344.187	Optimasi Tidak Bebas
7	Pengawasan PSU Kaw. Danau Singkarak Kab. Solok CV. Artistik Engineering Consultant	100.000.000	29/07/2019	99.132.000,00	-	-	02/12/2019	100%	99.132.000	868.000	PHO
8	Pembangunan PLP2K-BK Kaw. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya CV. Brintang Karya Gemilang	2.600.000.000	21/08/2019	2.289.731.102,68	14/11/2019	2.518.704.213,03	18/12/2019	100%	2.518.704.213	81.295.787	PHO
9	Pengawasan PLP2K-BK Kaw. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya CV. Total Citra Consultant	100.000.000	21/08/2019	99.481.250,00	-	-	18/12/2019	100%	99.481.250	518.750	PHO
10	Kegiatan Pembangunan Pariwisata Linggal (2018) CV. Bana Baraka	1.067.986.500	22/06/2018	1.067.986.500	10/09/2018	1.067.986.500	14/01/2019	100%	1.067.986.500	-	PHO
11	Kegiatan Pengawasan Pariwisata Linggal (2018) CV. Pagar Sukma	64.766.000	22/06/2018	64.766.000	10/09/2018	-	14/01/2019	100%	64.766.000	-	PHO
12	Kegiatan Pembangunan Pariwisata Linggal (Lanjutan) CV. Permata Nagari	200.000.000	21/11/2019	199.124.655,50	-	-	20/12/2019	100%	199.124.656	875.345	PHO
13	Kegiatan Pengawasan Pariwisata Linggal (lanjutan) CV. Total Citra Consultant	10.000.000	21/11/2019	9.900.000	-	-	20/12/2019	100%	9.900.000	100.000	PHO
<b>Total</b>		<b>11.315.280.200</b>		<b>10.066.065.302</b>					<b>8.188.211.712</b>	<b>3.127.068.488</b>	

Padang, 02 Januari 2020  
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

  
Sirdany, ST, MM  
NIP. 19620212 199203 1 008





**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

U-DITCH R1.



50%



100%



100%




**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

JALAN BETON R8



0%

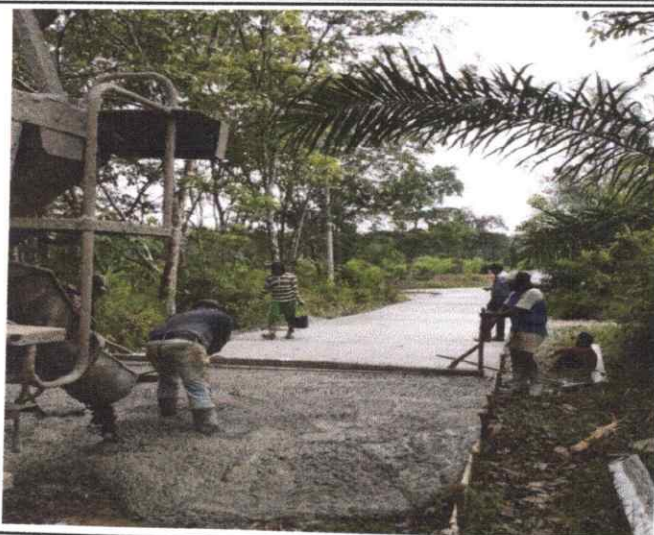

50%



100%





**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

JALAN BETON R2



0%



50%







100%



# FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan  
Lokasi  
Tahun




: PENGAWASAN PEMBANGUNAN PSU KAWASAN STRATEGIS DANAU SINGKARAK  
: VII KOTO SINGKARAK, KAB. SOLOK  
: Anggaran 2019

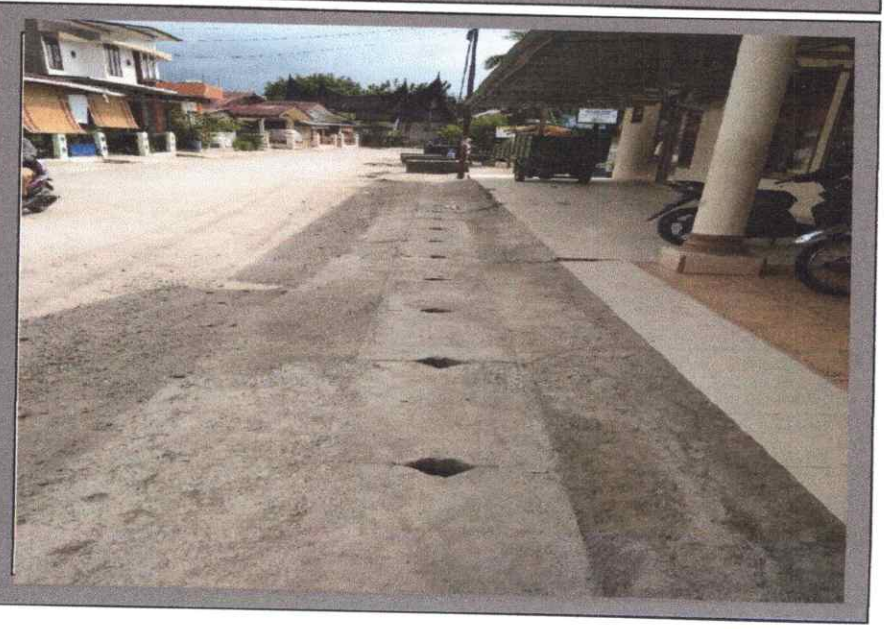



# FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan : PENGAWASAN PEMBANGUNAN PSU KAWASAN STRATEGIS DANAU SINGKARAK  
Lokasi : VII KOTO SINGKARAK, KAB. SOLOK  
Tahun : Anggaran 2019





## FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)  
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam  
Lokasi : Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya  
T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN PARKIRAN



Pekerjaan Pek. Beton  
Lantai Parkir K.300 (Ready  
Mix)

0%



Pekerjaan Pek. Beton  
Lantai Parkir K.300 (Ready  
Mix)

0%



Pekerjaan Pek. Beton  
Lantai Parkir K.300 (Ready  
Mix)

50%



## FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)  
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam  
Lokasi : Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya  
T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN PARKIRAN



Pekerjaan Beton Lantai Parkir K.300 (Ready Mix)

**50%**



Pekerjaan Beton Lantai Parkir K.300 (Ready Mix)

**50%**



Pekerjaan Beton Lantai Parkir K.300 (Ready Mix)

**50%**



## FOTO DOKUMENTASI


Kegiatan : Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)  
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam  
Lokasi : Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya  
T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN PARKIRAN



Pekerjaan Beton Lantai  
Parkir K.300 (Ready Mix)

**100%**

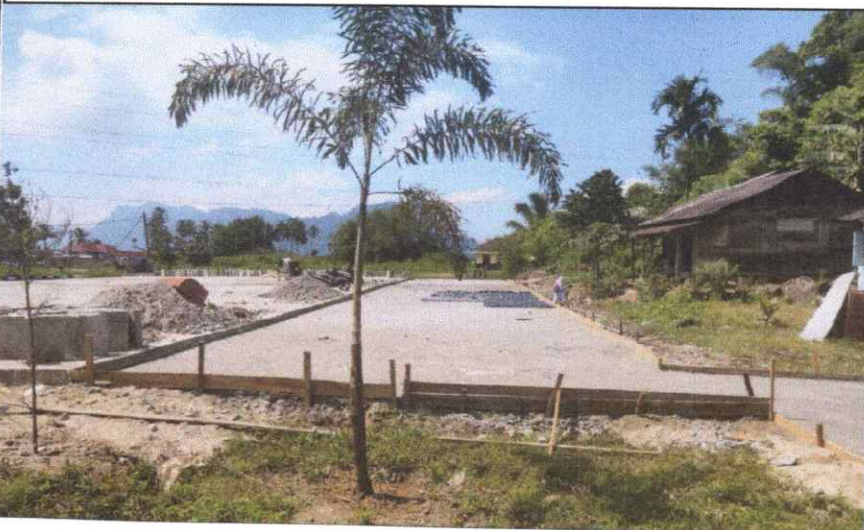

Pekerjaan Beton Lantai  
Parkir K.300 (Ready Mix)

**100%**



Pekerjaan Beton Lantai  
Parkir K.300 (Ready Mix)

**100%**



## FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)  
 Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam  
 Lokasi : Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya  
 T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN KANSTIN



Pekerjaan Krib Beton Type L

**0%**



Pekerjaan Krib Beton Type L

**50%**



Pekerjaan Krib Beton Type L

**50%**



## FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)  
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam  
Lokasi : Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya  
T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN KANSTIN



Pekerjaan Pengecatan Krep Beton

**100%**



Pekerjaan Pengecatan Krep Beton

**100%**



Pekerjaan Pengecatan Krep Beton

**100%**



## FOTO DOKUMENTASI


Kegiatan : Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)  
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam  
Lokasi : Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya  
T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN KANSTIN



Pekerjaan Pengecatan Kreb Beton

**100%**

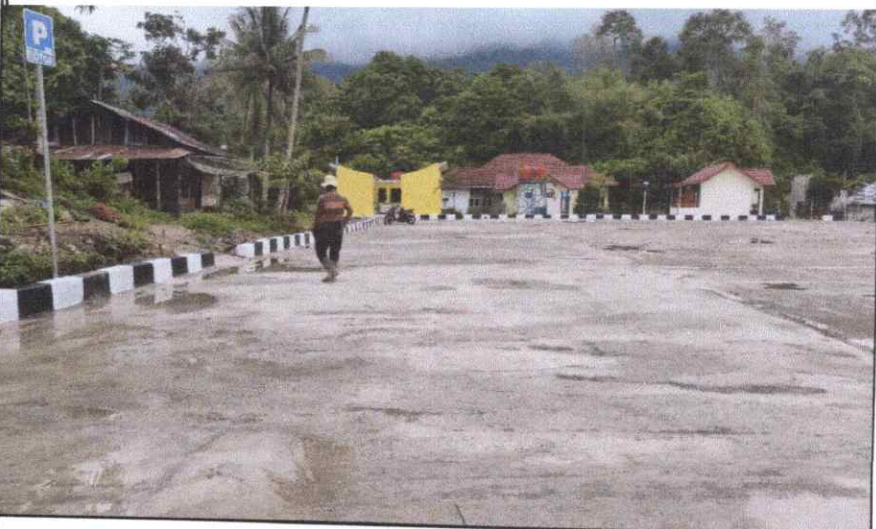

Pekerjaan Pengecatan Kreb Beton

**100%**



Pekerjaan Pengecatan Kreb Beton





**100%**



## FOTO DOKUMENTASI

**Kegiatan** : Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)  
**Pekerjaan** : Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam  
**Lokasi** : Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya  
**T. Anggaran** : 2019

### PEKERJAAN GREEN OPEN SPACE

		Pek. Penanaman Palem Ekor Tupai dan Ketapang kencana (Terminalia Mantaly) T. 2,5 M
		Pek. Penanaman Palem Ekor Tupai dan Ketapang kencana (Terminalia Mantaly) T. 2,5 M
		Pek. Penanaman Palem Ekor Tupai dan Ketapang kencana (Terminalia Mantaly) T. 2,5 M
		<b>0%</b>
		<b>50%</b>



## FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)  
 Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam  
 Lokasi : Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya  
 T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN GREEN OPEN SPACE




Pek. Penanaman Palem Ekor Tupai dan Ketapang kencana (Terminalia Mantaly) T. 2,5 M

**100%**



Pek. Penanaman Palem Ekor Tupai dan Ketapang kencana (Terminalia Mantaly) T. 2,5 M

**100%**

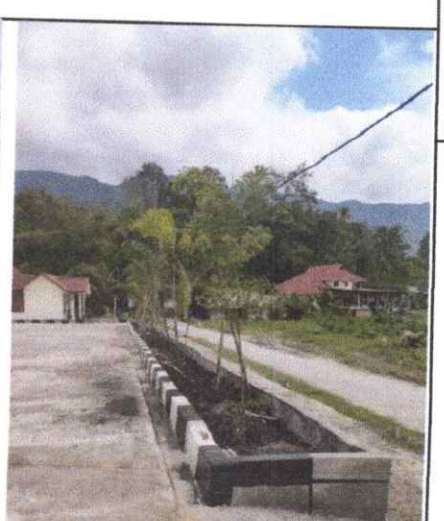

Pek. Penanaman Palem Ekor Tupai dan Ketapang kencana (Terminalia Mantaly) T. 2,5 M




**100%**



## FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi  
Pekerjaan : Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak Kab.Pasaman  
Lokasi : Nagari Sontang Cubadak, Kab. Pasaman  
T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN PEMBANGUNAN MCK







 A photograph showing a large area of ground covered with gravel and dirt, prepared for construction. In the background, there are several existing buildings and trees under a clear sky.	MCK 1
	0%
 A photograph of a building's foundation. The concrete walls are partially completed, and a red corrugated metal roof is visible. A worker in a blue shirt is visible near the base of the structure.	MCK 1
	50%
 A photograph of a building under construction. The structure is supported by a complex wooden scaffolding system. The roof is blue, and the walls are grey concrete.	MCK 1
	50%



## FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi  
Pekerjaan : Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak Kab.Pasaman  
Lokasi : Nagari Sontang Cubadak, Kab. Pasaman  
T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN PEMBANGUNAN MCK

	MCK 2
	0%
	MCK 2
	50%
	MCK 2
	50%



## FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi  
Pekerjaan : Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak Kab.Pasaman  
Lokasi : Nagari Sontang Cubadak, Kab. Pasaman  
T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN PEMBANGUNAN MCK



MCK 3

0%



MCK 3

50%



MCK 3




50%



## FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi  
Pekerjaan : Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak Kab.Pasaman  
Lokasi : Nagari Sontang Cubadak, Kab. Pasaman  
T. Anggaran : 2019

### PEKERJAAN SALURAN U-DITCH

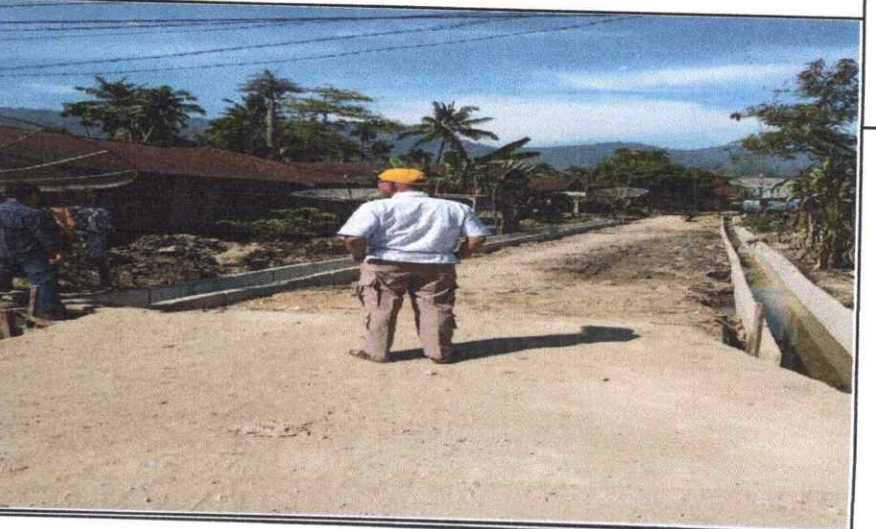	SALURAN
	0%
	SALURAN
	50%
	SALURAN
	50%

### FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi  
Pekerjaan : Pembangunan PLP2K-BK Kawasan Sontang Cubadak Kab.Pasaman  
Lokasi : Nagari Sontang Cubadak, Kab. Pasaman  
T. Anggaran : 2019

#### PEKERJAAN SALURAN U-DITCH



SALURAN

0%



SALURAN

50%

SALURAN
